



SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	<u>REV. 0</u>
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	<u>20/11/2013</u>	<u>RO-013</u>

**Ubicación:** DeAcero Morelia( Acometida de la estación de medición y regulación)

**Justificación (origen de la falla):**  
Fuga en la línea de acometida de la caseta mencionada


**Procedimiento empleado:**  
Excavación, instalación de tubería y soldado de acuerdo a las normas

**Descripción general:**  
Se instaló nueva tubería a la acometida, desviando dirección de la tubería y abandonando el tramo de la fuga, realizándose de acuerdo a la norma

**Herramientas y equipos empleados:**  
Maquinaria de soldar, herramientas manuales y rotomartillos para concreto, equipo de compactación

**Nombre de la empresa contratista:** Feliciano Barrera Miranda

**Evidencias fotográficas de reparación:**

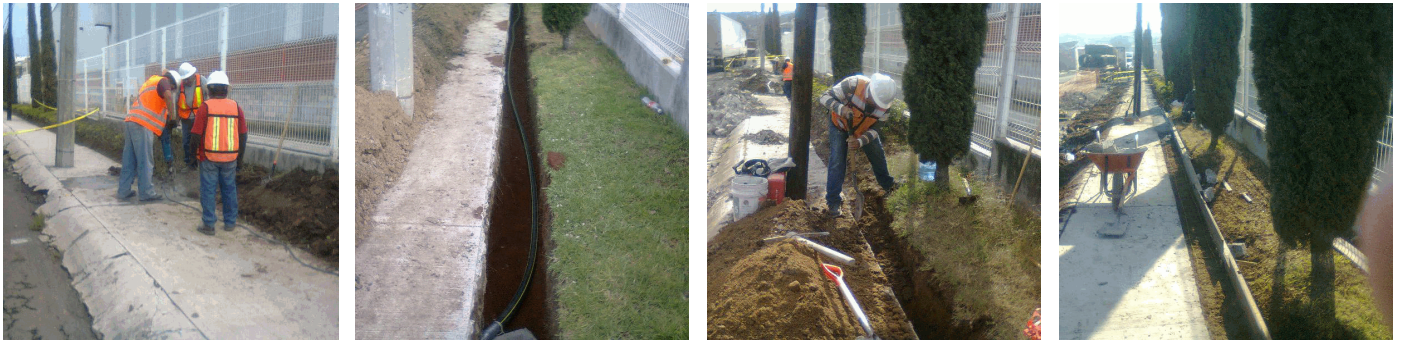

**Observaciones:**  
Queda pendiente el dictamen de abandono de línea y cambio de dirección de la tubería

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/11/2013 06:58:41p.m.  
**Fecha de aprobación:** 29/11/2013 08:35:50a.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca
