




REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V. PERIODO: 06-Dec-2013 05-Jun-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: SEMESTRAL **RO-007**

Equipo empleado: FLUKE 787 PROCESSMETER
 Fecha de calibración: 16/04/2013 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: AC-1342

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: Interconexión Hyundai (entrada).
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 10.20
 Observaciones:
Valor dentro de rango.

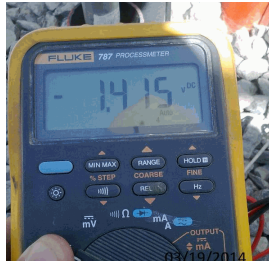


Numero: 2
 Ubicación: Interconexión Hyundai (intermedio).
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 9.50
 Observaciones:
Valor dentro de rango.



Numero: 3
 Ubicación: Interconexión Hyundai (salida).
 VCC-CSE (volts): -1.42
 VCA-CSE (volts): 7.50
 Observaciones:
Valor dentro de rango.



Numero: 4
 Ubicación: DDV Hyundai KM 0+528
 VCC-CSE (volts): -1.32
 VCA-CSE (volts): 15.60
 Observaciones:
Valor dentro de rango.

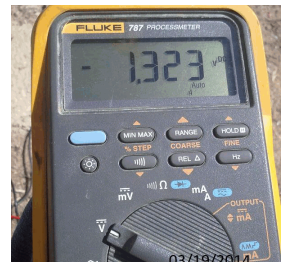

Numero: 5
 Ubicación: Hyundai de Mexico S.A. de C.V.
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 16.50
 Observaciones:
Valor dentro de rango.



CONTINUIDAD ELECTRICA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Apr-2014
 Fecha de aprobación: 07-May-2014
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	HYUNDAI DE MEXICO S.A DE C.V.	PERIODO:	06-Dec-2013 05-Jun-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta mi carta conforme a norma , ubicación salida caseta de medición.
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma , ubicación entrada tren de regulación
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.
Interconexión Hyundai	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma ,ubicación salida tren de regulación.
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Hyundai de Mexico S.A. de C.V.	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	21-Apr-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	07-May-2014
			Elaborado por:	Jésus Baldenegro Ayala
			Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández
